PROJETO AFRODITE

AFRY

RELATÓRIO SEMANAL

- STMA
- PERFORMANCE SEMANAL
- MAPA AVANÇO
- MAPA AVANÇO DRENAGEM

GrupoBoticário

GrupoBoticário

PROJETO AFRODITE

PERFORMANCE GERAL

Contratada

TERRAM ENGENHARI...

Ano, Mês

2026 (Ano) + outubr...

SemanaDoProjeto

31

STMA

PERFORMANCE SEMANAL

MAPA AVANÇO

MAPA AVANÇO DRENAGEM

AFRY

STMA

213
Dias Seguros

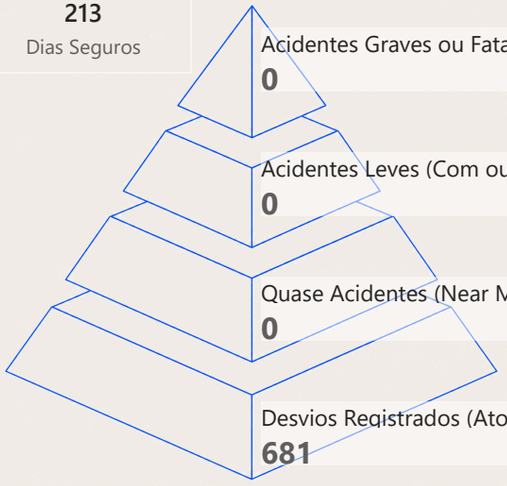

Acidentes Graves ou Fatais
0

Acidentes Leves (Com ou Sem Afastamento)
0

Quase Acidentes (Near Miss)
0

Desvios Registrados (Atos e Condições Inseguras)
681

DESVIOS GRAVES

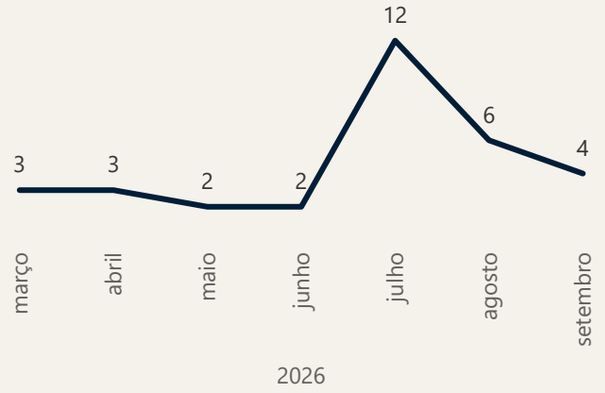

AÇÕES DESVIOS GRAVES

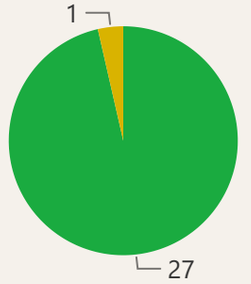

TOTAL DESVIOS



DESVIOS NO MÊS VIGENTE

6
Desvios do mês

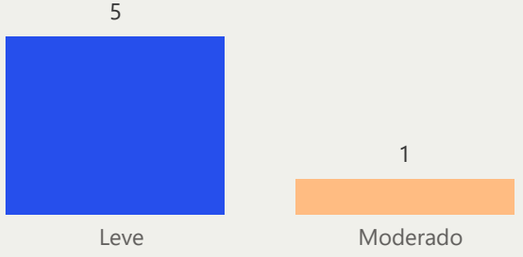

CLASSIFICAÇÃO DESVIOS GRAVES



Descrição desvios graves do mês - SETEMBRO	Classificação
Colaborador de subcontratada Terram acessando altura superior a 2m sem cinto e sem mapeamento de risco da atividade	Comportamento de risco
Colaborador executando atividade no interior de uma vala com material solto na crista lateral (vala com profundidade acima de 1,25m).	Condição insegura
Falta de barreira de segurança nas critas dos taludes, colocando em risco colaboradores que executam atividades nas proximidades.	Condição insegura
Ocorrência de rompimento de mangueira do sistema hidráulico do equipamento Motoscraper, ocasionando vazamento de fluido hidráulico em região aquecida, com geração de fumaça.	Condição insegura

GrupoBoticário

PROJETO AFRODITE

PERFORMANCE CONTRATADAS

Contratada: TERRAM ENGENHARI...

Ano, Mês: 2026 (Ano) + outubr...

SemanaDoProjeto: 31

STMA

PERFORMANCE SEMANAL

MAPA AVANÇO

MAPA AVANÇO DRENAGEM

AFRY

AVANÇO PREVISTO	AVANÇO REAL	DESVIO
63,7%	54,1%	-9,5%

ADERÊNCIA REAL



CURVA FÍSICA - MÊS

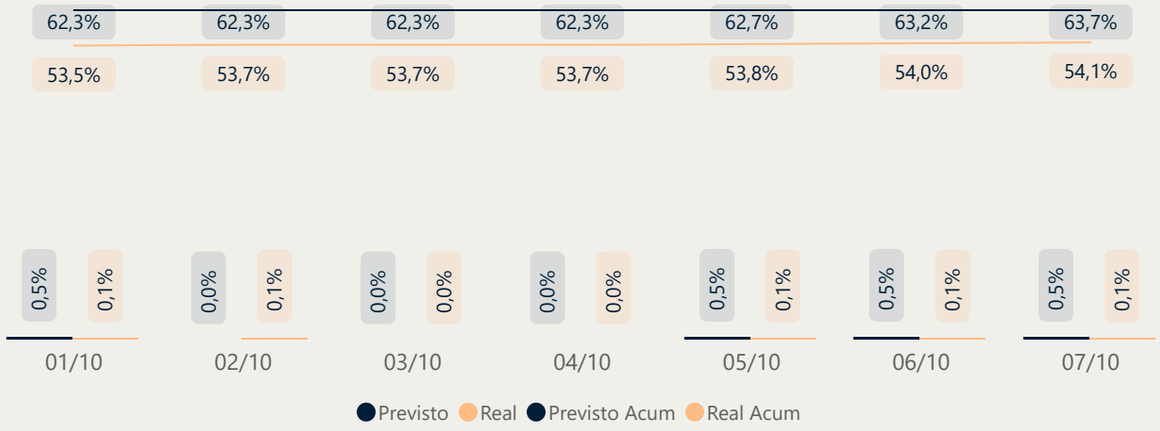

CURVA FÍSICA - ANO

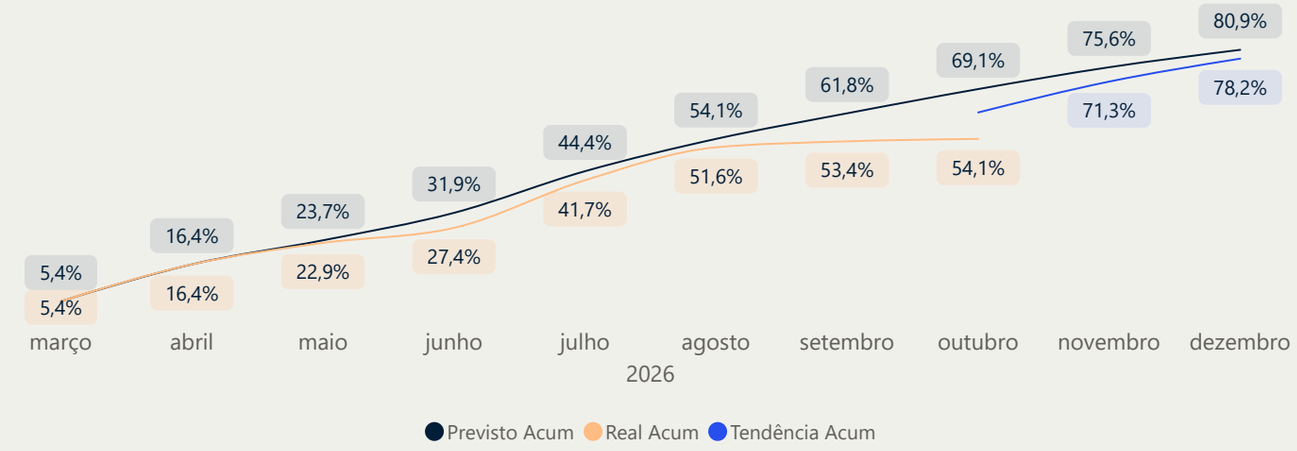

Farois Físico: *<95%* *>=95% <100%* *>=100%* *No prazo* *Tendência de Atraso* *Atrasado* *Concluído com atraso*

PLUVIOMETRIA HISTÓRICA X REAL (mm)



46	3
mm acum no mês	Dias impactados

HIGHLIGHTS

TERRAM:
• Recebimento de pleito de postergação de prazo do Contrato de Terraplanagem. Solicitado extensão de 87 dias, levando o final das atividades de 10/04/2027 para 06/07/2027. Em andamento análise de mérito pela AFRY.
• Recebimento de planilha de Reequilíbrio do Contrato de Terraplanagem contemplando: (i) redução da drenagem profunda (ii) encaminhamento de drenagem para a APP (iii) dispositivos de drenagem provisória para o terreno (iiii) ampliação do prazo nos itens de indireto em 87 dias. Em andamento análise de mérito pela AFRY.

PONTOS DE ATENÇÃO

TERRAM:
• Morosidade na recomposição dos tapumes danificados pós chuvas intensas. Solicitado tratativas para a Terram desde 01/09/26.
• Manutenção da drenagem provisória para garantir encaminhamento das águas das chuvas.

PRÓXIMOS PASSOS

TERRAM
• Término da recomposição dos tapumes.

Semana do Projeto = Quinta a Quarta

GrupoBoticário

PROJETO AFRODITE

PERFORMANCE CONTRATADAS

Contratada

TERRAM ENGENHARI...

Ano, Mês

2026 (Ano) + outubr...

SemanaDoProjeto

31

STMA

PERFORMANCE SEMANAL

MAPA AVANÇO

MAPA AVANÇO DRENAGEM

AFRY

	Previsto	Real
TRANSELEVADOR (m³)	100%	100%
DATA CENTER 1 (m³)	100%	100%
UTILIDADES (m³)	53%	13%
ATERRO GERAL (m³)	57%	35%

Milestone	Previsto	Real/Tend
Terraplanagem Subestação concluída	15/06/26	25/06/26
Terraplanagem Canteiro GC concluída	03/08/26	03/08/26
Terraplanagem Monobloco concluída	10/08/26	10/08/26
Terraplanagem Transelevador concluída	25/09/26	25/09/26
Conclusão da drenagem e proteção de taludes da área do Canteiro GC	25/09/26	10/11/26
Terraplanagem área dos 2 Data Centers concluída	30/11/26	30/11/26
Terraplanagem Área de Utilidades concluída	14/12/26	14/12/26
Terraplanagem Canteiro Transelevador concluída	24/12/26	24/12/26

Farois Físico: *<95%* *>=95% <100%* *>=100%* *No prazo* *Tendência de Atraso* *Atrasado* *Concluído com atraso*

GrupoBoticário

PROJETO AFRODITE

PERFORMANCE CONTRATADAS

Contratada

TERRAM ENGENHARI...

Ano, Mês

2026 (Ano) + outubr...

SemanaDoProjeto

31

STMA

PERFORMANCE SEMANAL

MAPA AVANÇO

MAPA AVANÇO DRENAGEM

AFRY

Em andamento revisão do projeto de drenagem considerando otimização da drenagem profunda. Previsão de emissão até 15/10.

DREN. SUPERFICIAL - ESCADAS

32%	20%
Previsto	Real

DREN. PROF. - SUBESTAÇÃO

100%	98%
Previsto	Real

DREN. PROF. - CANTEIRO GC

100%	29%
Previsto	Real

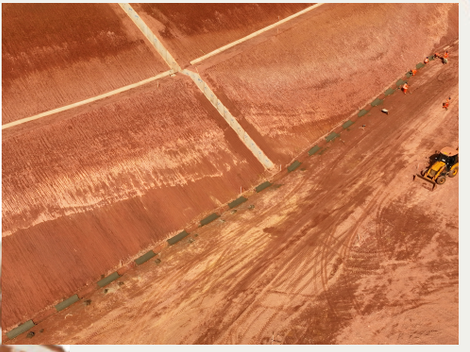

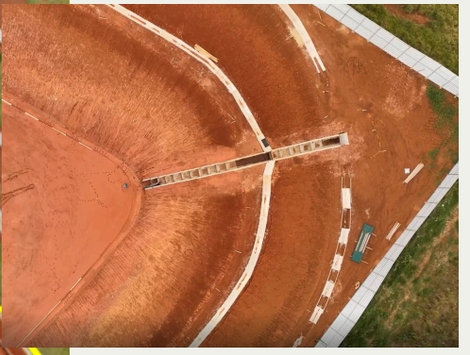

Farois Físico: *<95%* *>=95% <100%* *>=100%* *No prazo* *Tendência de Atraso* *Atrasado* *Concluído com atraso*

GrupoBoticário

Mês

set/26

STMA

PERFORMANCE SEMANAL

MAPA AVANÇO

MAPA AVANÇO DRENAGEM

PLUVIOMETRIA

AFRY

PLUVIOMETRIA

258
mm acum no mês

8,60
Média mm/dia

9
Dias impactados

PLUVIOMETRIA HISTÓRICA X REAL

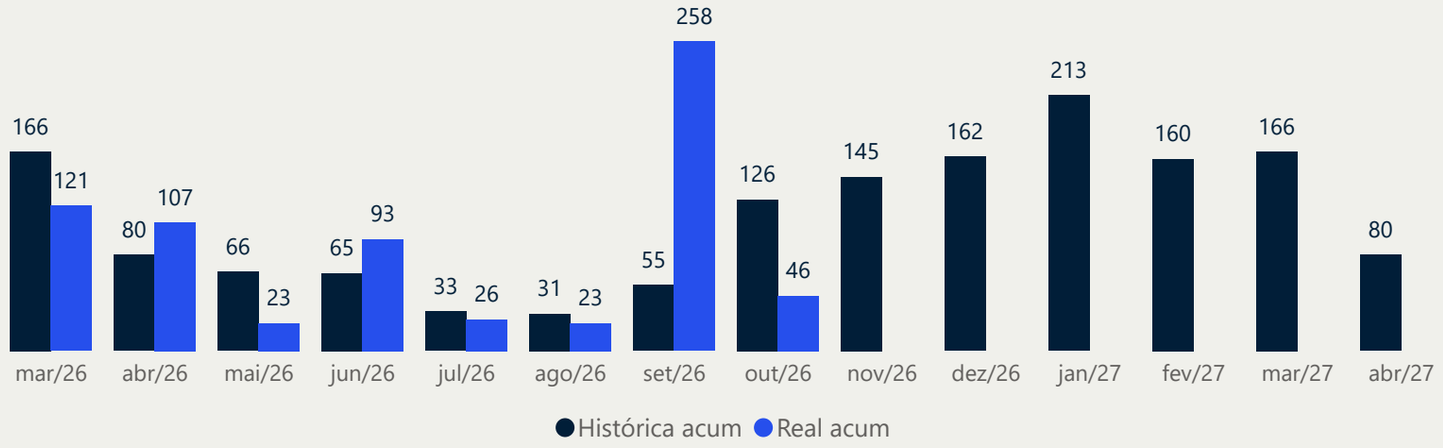

PLUVIOMETRIA AO LONGO DO MÊS

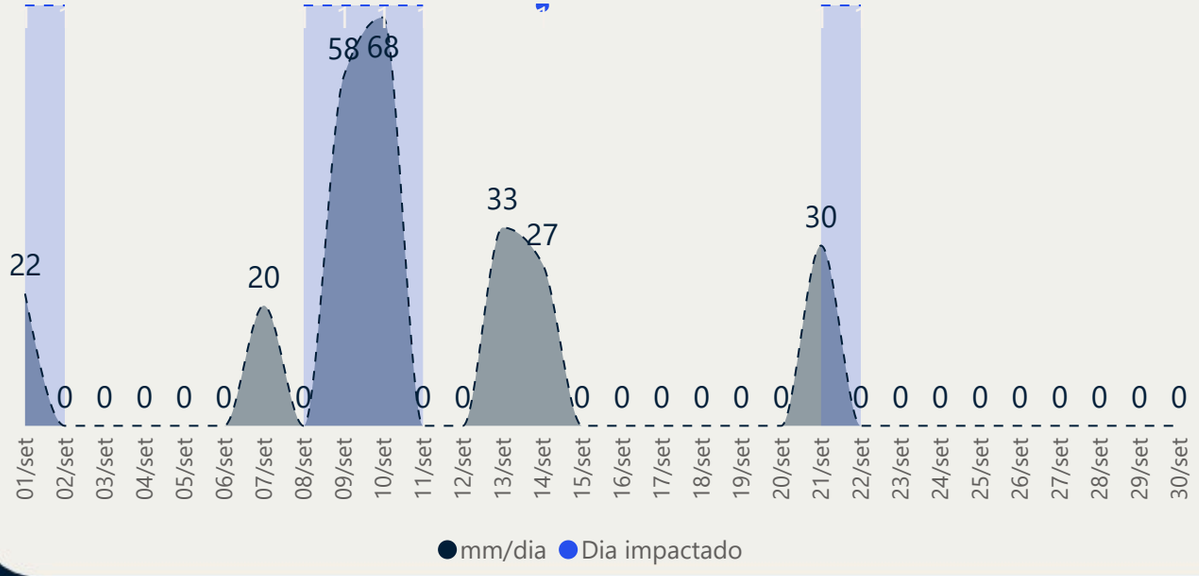

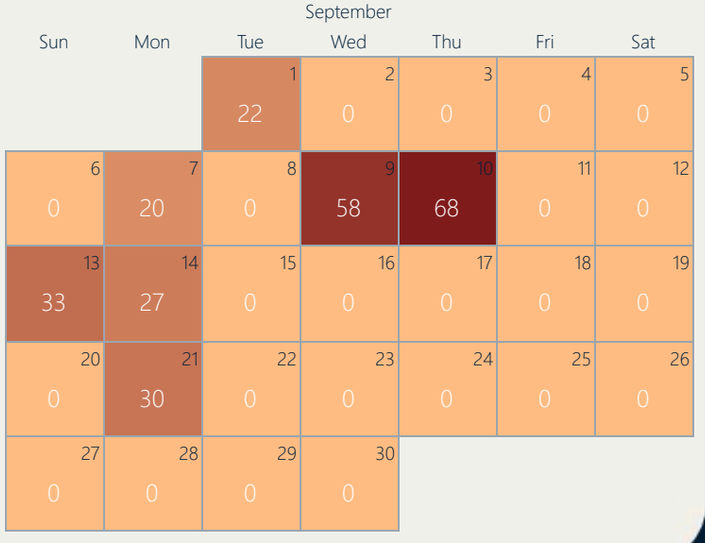

GrupoBoticário

PROJETO AFRODITE

PERFORMANCE CONTRATADAS

Contratada

TERRAM ENGENHARI...

Ano, Mês

2026 (Ano) + outubr...

SemanaDoProjeto

31

STMA

PERFORMANCE SEMANAL

MAPA AVANÇO

MAPA AVANÇO DRENAGEM

AFRY

SERVIÇOS NOTÁVEIS

Serviço Notável

Aterro Geral

61%
Aderência

Serviço Notável	Un	Total	Previsto Acum	Real Acum
Aterro - Data Center 1	m³	13.600	13.600	13.600
Aterro Geral	m³	807.058	461.718	279.421
Escavação - ÁREA GERAL	m³	541.517	236.288	208.786
Escavação - CANTEIRO TRANSELEVADOR	m³	158.500	71.309	26.803
Escavação - TRANSELEVADOR	m³	99.300	99.300	99.300
Escavação - UTILIDADES	m³	39.000	20.661	4.984
Muro de Contenção	m²		0	0

CURVA DE SERVIÇOS NOTÁVEIS

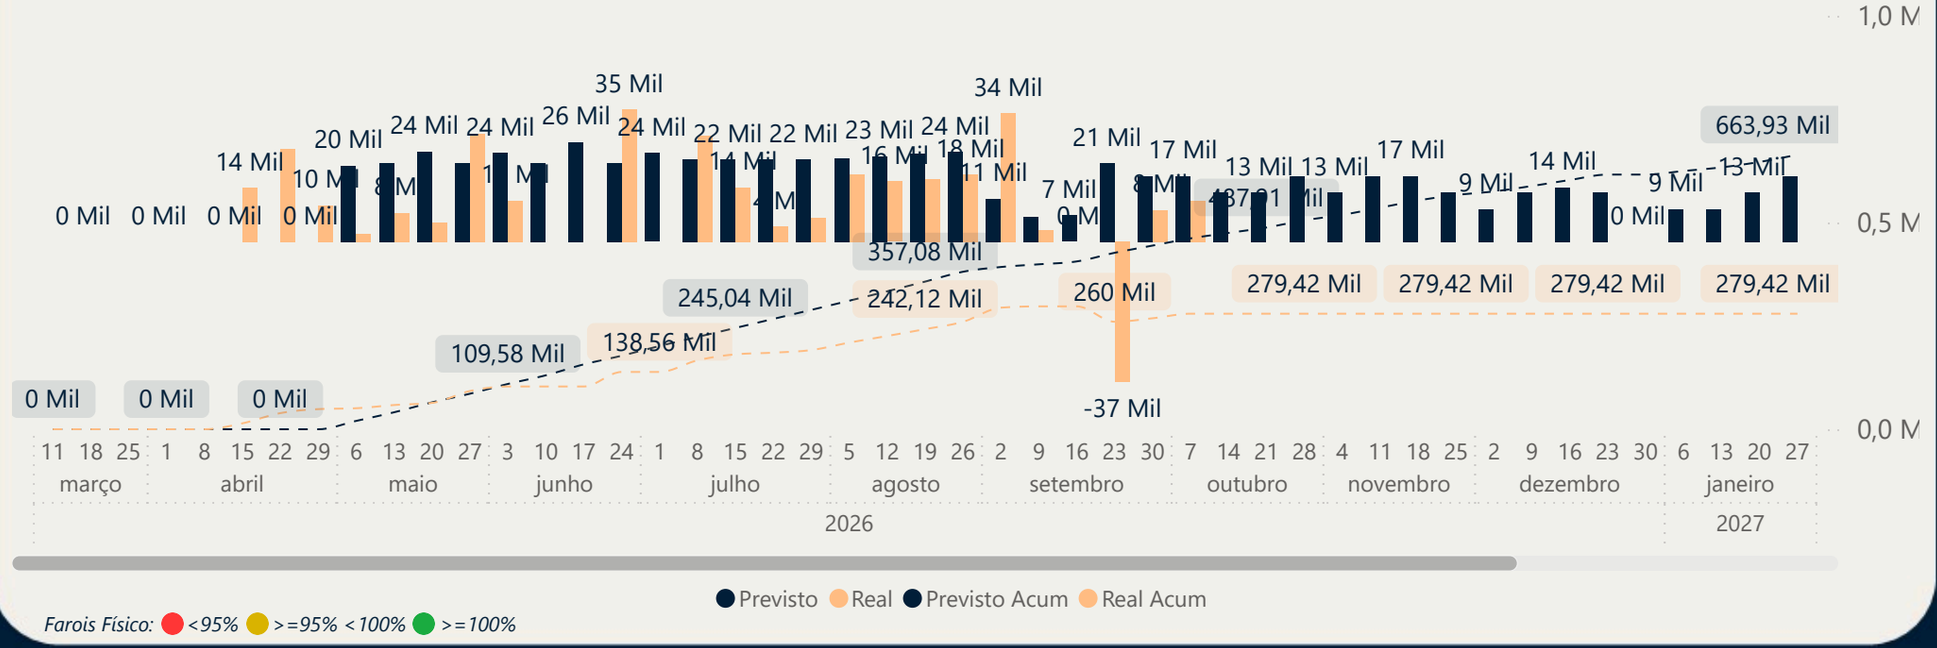

Farois Físico: <95% >=95% <100% >=100%
